

LOCALISATION

Commune BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Adresse RUE PAUL DAGUERCAR

X Lambert 93 666273.59
Y Lambert 93 7043317.39

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1000

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte indéterminée

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h Débit 60 m³/h

PLAN DE SITUATION

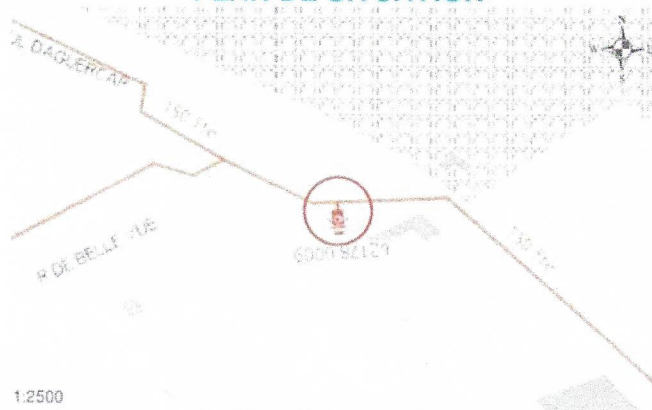


PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	15/10/2018	CONFORMITE *	OUI
Pression statique	4.4 bars	Débit sous 1 bar	144 m ³ /h
Pression résiduelle à 60 m ³ /h	3.3 bars	Débit max	

CONTROLE MECANIQUE

Date	15/10/2018	Volant
Bouche à Clé		Carré de manoeuvre
Vanne		Coffre
Peinture		Serrure
Numerotation		Socle
Protection		Etat bouchons
Poteau à réhausser		Etat joints
Etat du massif béton		Commande de vidange
En Service	Non	Manoeuvre
Etat général		Graissage
Accessibilité		Clapet
Poteau à renouveler		Minikit choc
		Remise en état
		signalisation

Commentaires
RAS
